

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年11月 9日

計画の名称	庄原市総領処理場長寿命化（防災・安全）		
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	庄原市
計画の目標			

老朽化した公共下水道施設について、安全・安心な市民生活を確保するため長寿命化計画を策定し計画的な改築更新を行う。

計画の成果目標（定量的指標）

①処理場における長寿命化計画策定率を0%（H24末）から25%（H26末）に向上させる。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

備考

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)							
(例) 処理場における長寿命化計画策定率 長寿命化計画策定済みの処理場数（箇所） / 処理場数（箇所）	—	0%	25%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	22百万円	A	22百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
庄原市下水道課において実施	平成27年度(事業終了後)
	公表の方法

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
総領処理区																	
A-3	下水道	一般	庄原市	直接	—	汚水	改築	総領処理場（長寿命化計画策定）	計画策定・詳細設計業務	庄原市							22
											小計		22				

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
											合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
											合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・計画を策定したことにより、施設の長寿命化を図るための指標が明確となり、今後の執行体制が整った。
- ・同時に調査結果から、施設の現状把握することにより予防保全型管理が可能となり、予算の低減効果が見込まれる。
- ・下水道台帳を整備したことにより、下水道施設等の維持管理が効率良く実施できるようになった。

II 定量的指標の達成状況	(例) 指標① (計画策定の進捗率)	最終目標値	25%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	25%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)


3. 特記事項 (今後の方針等)

施設の予防保全型管理を行い、長寿命化を図り、ライフサイクルコストを縮減していく。

社会資本総合整備計画（下水道事業）

計画の名称	庄原市総領処理場長寿命化(防災・安全)	交付対象	庄原市
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）		

総領処理区計画図

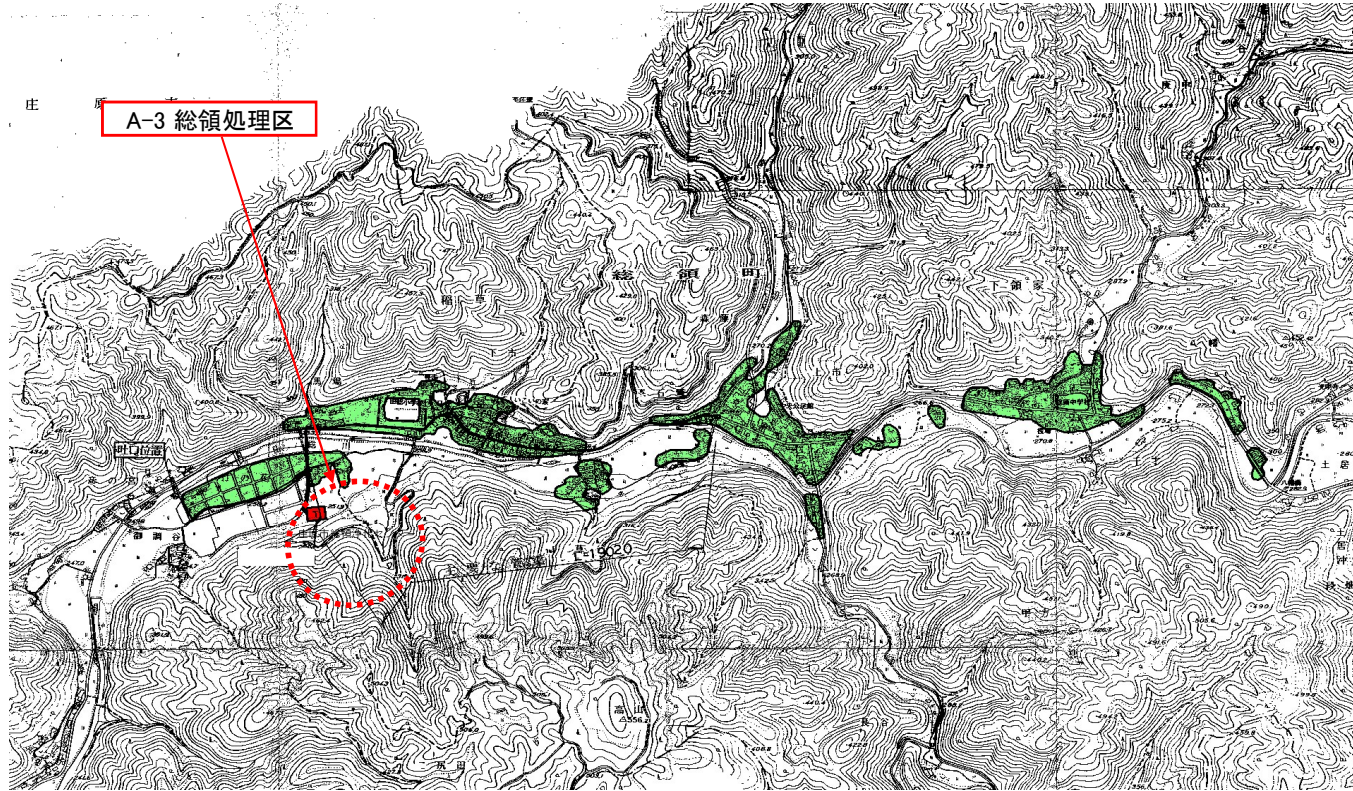

本事業の実施は下水道事業計画区域内で行う。
